

REPORTE DE ACTIVIDADES: MES DE FEBRERO DEL
2023

C. ALFREDO PEREZ TORRES
DIRECTOR DE AGUA POTABLE

DEOLLADO, JALISCO


A 03 MARZO DEL 2023

A QUIEN CORRESPONDA:

Degollado Jalisco, a 04 de Marzo del 2023

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 Febrero al 28 de Febrero del 2023, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

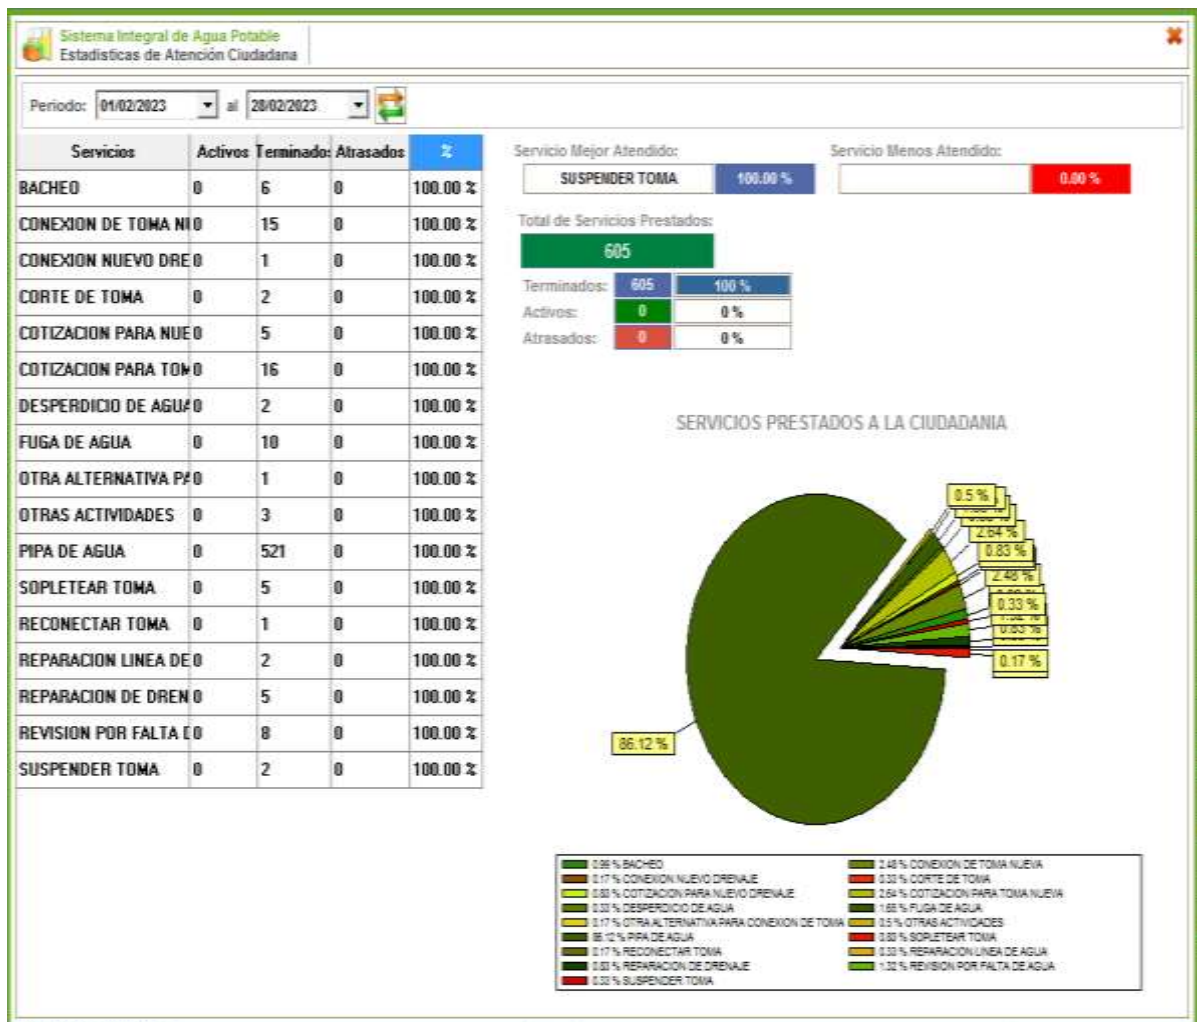

BITÁCORA DE REPORTES REALIZADOS POR PERSONAL OPERATIVO:

MIÉRCOLES 1 DE FEBRERO DEL 2023: Se instaló drenaje en calle Pedro Moreno #10, se utilizó 1 tubo de 6" PVC, 1 cople de 6" PVC, ¼ de bulto de cemento y 1 bote de arena; se retiró un viaje de escombros. Se rentó rotomartillo y generador. Se hizo cotización para toma nueva en calle Jesús Navarro #28. Se hizo cotización para toma nueva en calle Guadalupe Méndez. Se hizo cotización para toma nueva en calle 5 de mayo.

JUEVES 2 DE FEBRERO DEL 2023: Se sopleteó toma de agua en calle Gabriel Velázquez. Se reparó fuga de agua en calle 5 de febrero con el señor Salvador Cervantes, se utilizó 1 niple de 2" x ½" galvanizado y 1 cople de ½" galvanizado. Se reparó fuga de agua en calle Nicolás Bravo, en la toma del salón IBIZZA, se utilizó 1m de manguera, 2 conectores cónicos, 1 codo de ½" x 90° galvanizado, 1 cople de ½" galvanizado, ½ bulto de cemento, 2 botes de arena y ½ bote de grava. Se hizo cotización para toma de agua y drenaje en calle Rivera. Se hizo cotización en Blvd. Juan Bravo.

VIERNES 3 DE FEBRERO DEL 2023: Se conectó nuevo drenaje y dos tomas de agua en la calle Av. De La Paz.

MARTES 7 DE FEBRERO DEL 2023: Se comenzó a instalar línea de agua en el carril para los hermanos Coronado. Se utilizó una T 2" PVC, 1 codo de 2" PVC, 2 coples 2" PVC, 1 tapón de 2" PVC, 4 abrazaderas de 2" PVC, 4 válvulas, 2 conectores cónicos, 2 Mts. de manguera y 8 tubos de 2" PVC H.D. Se rentó máquina excavadora por dos horas y media.

MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO DEL 2023: Se conectó nueva toma de agua en Camino a los Arrayanes, se utilizó 1 abrazadera de 3" PVC, 1 válvula, 1 llave de paso, 1 conector cónico y 3m de manguera. Se instaló otra toma de agua Camino a los Arrayanes, se utilizó un codo pipa PVC de ¾" a ½", 1 conector cónico, 1 abrazadera de 3" PVC, 1 válvula, 1 tapón ½" PVC y 3m de manguera. Se pusieron 2 abrazaderas y 2 válvulas en el carril, para la toma nueva de los Coronado.

JUEVES 10 DE FEBRERO DEL 2023: Se conectó nueva toma de agua en calle Manuel Ávila Camacho #47, se utilizó 1 codo de ½" galvanizado y 1 conector cónico. Se hizo cotización para toma de agua en la colonia San José Buen Agua con Érika Janeth Romo. Se cotizó toma nueva en calle Manuel Arellano #24. Se hizo cotización para drenaje en camino a los Arrayanes, se repararon 2 fugas de agua en el Carril.

VIERNES 11 DE FEBRERO DEL 2023: Se canceló toma de agua en calle Manuel Ávila Camacho. Se localizó y reparó fuga de agua en línea de 3" de calle Pedro Moreno, entre Madero y 20 de noviembre.

LUNES 13 DE FEBRERO DEL 2023: Se hizo corte de concreto para reparaciones de drenaje en Prolongación Morelos, en el Restaurante "La Sierrita".

MARTES 14 DE FEBRERO DEL 2023: Se conectó drenaje en calle Prol. Morelos, se utilizaron 4 tubos de 6", 4 coples de 6" PVC, 4 codos de 6" x 90° PVC, 1 reducción de 6" a 4" PVC, ½ bulto de cemento y ½ carretilla de arena.

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO DEL 2023: Se retiró el escombros de la reparación en la calle Prol. Morelos, la próxima semana se le hace parche de concreto. Se hizo reparación de un baño en el DIF Municipal. Se hizo cotización para drenaje en calle Gómez Farías #97. Se hizo revisión en la escuela de Altamira, hay varios detalles que se tienen que atender.

JUEVES 16 DE FEBRERO DEL 2023: Se apoyó a los compañeros de obras públicas con corte de concreto. Se reparó fuga de agua en calle Manuel Ávila Camacho, se utilizó 1 codo pipa de ½" de cobre.

VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2023: Se reparó fuga de agua en línea de conducción del pozo de Tejería, se utilizaron 7m de tubo de 8" y 1 cople de 8" PVC. Se hizo cotización para drenaje y toma de agua en Camino a los Arrayanes con el señor Antonio Camarena. Se hizo cotización para drenaje y toma de agua en Camino a los Arrayanes, con la señora Ernestina Camarena. Se estuvieron checando las líneas de agua de las calles Allende, Ruperto Zaragoza y República.

LUNES 20 DE FEBRERO DEL 2023: Se repararon fugas de agua en el Camino a los Ranchitos, donde Oras Públicas están comenzando con el proyecto de concreto, se utilizaron 2 tapones hembra de ½" galvanizados. Se hizo cotización para toma de agua en calle Leopoldo García #33. Se revisó toma de agua en calle Aldama #10 con la señora Carmen García. Se comenzó a escarbar para localizar una fuga en "El Tecolote".

MARTES 21 DE FEBRERO DEL 2023: Se reparó fuga de agua en tubo principal que va del pozo al depósito del Tecolote, se utilizó 1m de tubo de 3" PVC H.D. y 2 coples de 3" PVC H.D. Se repararon 4 fugas de agua en "El Tecolote", se utilizaron 4 tapones de ½" PVC. Se hizo cotización para toma de agua en calle Circunvalación #81. Se revisó la toma de agua en el domicilio M. Diéguez #59.

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO DEL 2023: Se hizo cotización para toma de agua en calle Rufino Tamayo, de la colonia Juan Gil Preciado. Se reparó fuga en calle 5 de mayo esquina con calle Mercado, se utilizó cople de 3" PVC H.D. Se hizo cotización en calle Javier García Paniagua #19.

JUEVES 23 DE FEBRERO DEL 2023: Se escarbó para instalar nueva toma de agua en calle Javier García Paniagua, se utilizó 1 cople de ½" PVC de inserción, 1.5m de manguera y 1 conector cónico. Se hizo cotización para drenaje en calle Gómez Farías. Se recogió escombros en la calle 5 de mayo esquina con Mercado y se le llevó un viaje de tepetate.

VIERNES 24 DE FEBRERO DEL 2023: Se conectó toma de agua en calle Rufino Tamayo, se utilizaron 10m de manguera, 1 válvula, 1 conector y una abrazadera de 2" PVC. Se reparó una fuga de agua en la calle Rufino Tamayo, se utilizó 1m de tubo de 2" PVC y 2 coples de 2" PVC. Se fue a ubicar una fuga

de agua en línea de 2" del Tecolote. Se hizo una cotización en la calle Juan de la Barrera.

LUNES 27 DE FEBRERO DEL 2023: Se hizo reparación en el pozo presa II, se utilizó 1 empaque de neopreno de 4". Se reparó drenaje en calle Juan de la Barrera, se utilizó 1 tubo de 12" PVC sanitario.

MARTES 28 DE FEBRERO DEL 2023: Se conectó toma nueva en Camino a los Arrayanes, se utilizó 1 abrazadera de 3" PVC, 1 válvula, 1 tapón de ½" PVC inserción y 2.5m de manguera. Se hizo cotización para toma de agua en Blvd. Juan Bravo. Se hizo cotización para toma de agua en calle Allende. Se conectó toma de agua en Camino a los Arrayanes, se utilizaron 3m de manguera, 1 válvula, 1 tapón de PVC y 1 abrazadera de 3" PVC. Se hizo cotización en calle Rivera, frente al corralón. Se hizo cotización en la colonia Javier García Paniagua.

Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:

Reparación de fugas





Instalación Agua y Drenaje







La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de FEBRERO de 2023

-Ingreso por Agua:

Periodo: 01/02/2023 al 28/02/2023							
Cuota Fija:	\$1,257,172.70	Bonificación:	\$417,362.46	Reconexión:	\$0.00	Total	
Saneamiento:	\$302,889.35	Sanción:	\$36,036.53	Otros:	\$19,070.11	\$1,650,612.50	
Infraestructura:	\$54,521.17	Certificados:	\$0.00	Bonificaciones		No. de Recibos:	836
Permiso de Instalación:	\$0.00	Reposición:	\$45,232.68	Tercera Edad:	\$24,083.66	No. de Contratos:	759
Conexión de Agua:	\$16,552.00	Materiales:	\$22,027.28	Viuda:	\$4,263.71		
Conexión Alcantarillado:	\$20,270.60	Permiso para Romper:	\$17,628.00	Discapacidad:	\$1,065.93		
Rezagos:	\$257,274.30	Gastos de Ejecución:	\$4,074.16	Pensionado:	\$0.00		
Recargos:	\$12,490.82	Mano de Obra:	\$2,734.47				

