


## A QUIEN CORRESPONDA:

### Degollado Jalisco, a 24 de Enero del 2019

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 de Diciembre al 21 de Diciembre de 2018, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

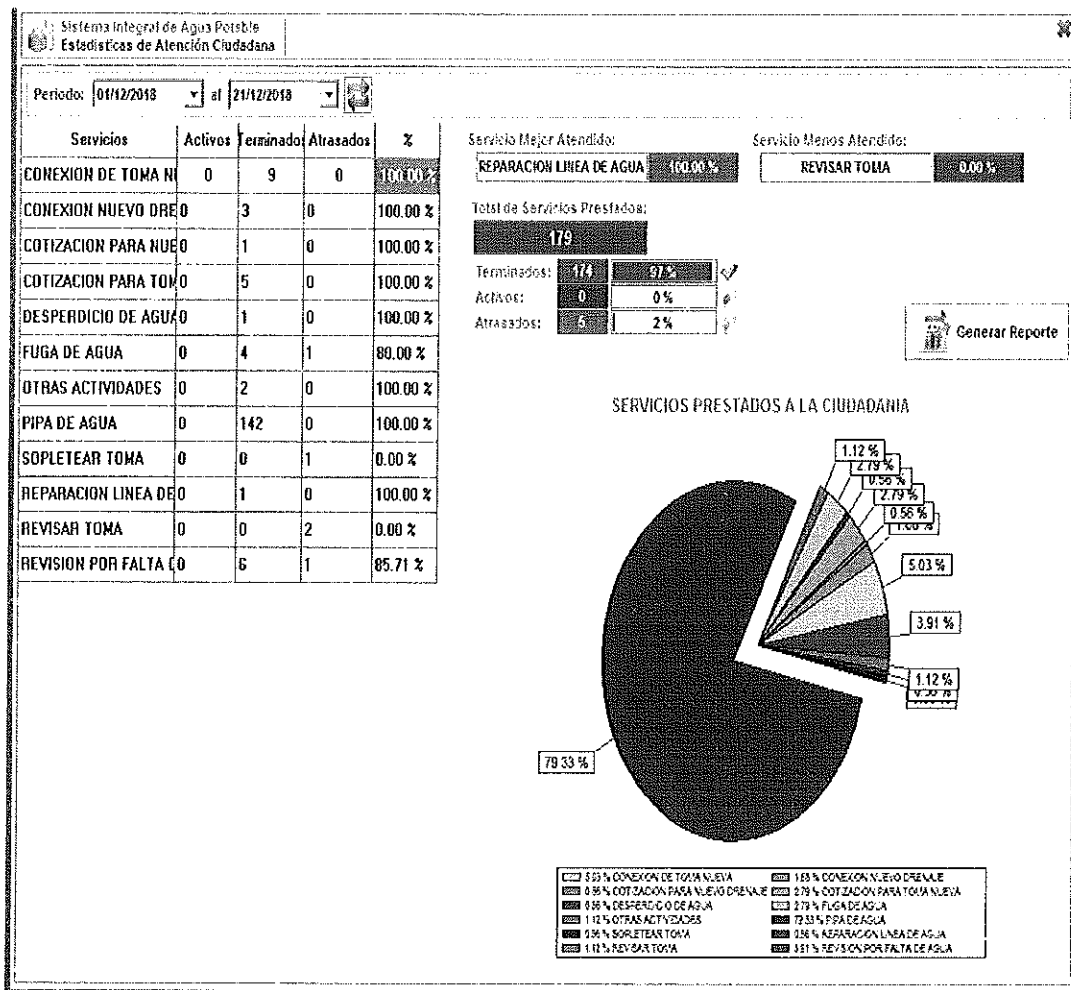


*Bitácora de reportes realizados por personal operativo:*

**3 de diciembre del 2018** se hicieron dos cotizaciones una para la calle Manuel Arellano y otra para la calle Guerrero #209; se hecho el parche de Ocampo esquina con la botana y se echó otro parche en corregidora #175; se fue a conectar la línea de agua en la Colonia García Paniagua pero no tenía la manguera adecuada; se reparó una fuga en Guerrero. **4 de diciembre del 2018** se reparó una fuga de agua en la calle Vallarta del tubo de 8" ; se conectó la toma de agua en la Colonia García Paniagua y se reparó la llave del pozo en la Calle prolongación Manuel Arellano; se reparó una fuga de agua en Guerrero en el tubo de 3". **5 de diciembre del 2018** se echaron 2 parches en la calle Emiliano Zapata esquina con Ramón López; se realizó una cotización para toma de agua en la calle reforma #140; se fueron a Guerrero apoyar con las fugas de agua y se inició con la excavación de la colonia San José buen agua para cambiar el tubo. **6 de diciembre del 2018** se conectó la línea de agua en la colonia San Jose buen agua y se conectó la toma de Morelos 447 y se recogió el escombros de la calle Emiliano Zapata y se cortó con la cortadora en la calle Jesús Navarro donde hay una fuga. **7 de diciembre del 2018** se buscó la fuga de agua en la calle Jesús Navarro pero no se encontró se conectaron Tomás en la calle Guerrero y se hizo una cotización en el mogote del dinero. **10 de diciembre del 2018** se terminó de conectar las tomas de Guerrero se reparó una fuga en Prol. Jesús Navarro #54 y se reparó otra fuga en Prol. Jesús Navarro S/N y se suspendió una toma que se estaba pasando agua a domicilio Jesús Navarro #53 se revisó el drenaje de Carranza #130 y se destapó el drenaje del rastro; se reparó una fuga en A.S. Bravo. **11 de diciembre del 2018** se siguió buscando la fuga de Jesús Navarro; salimos a la 1 de la tarde, por autorización del director. **13 de diciembre del 2018** se terminó de arreglar la fuga en Jesús Navarro; se conectó la toma en guerrero #209; se sopeteó una toma en el boulevard Niños Héroes #266; se echó tepetate en Jesús Navarro en donde estaba la fuga. **14 de diciembre del 2018** se revisó una toma en Guerrero se llevó cloro al pozo de los novios; se echó el parche en la calle 5 de febrero y se limpiaron 2 registros. **17 de diciembre del 2018** se cortó el sácate del pozo presa 2 y se rayó con cal en la calle Beatriz Hernández; se echó el parche de la calle A. S. Bravo; se revisó la línea de la calle 16 de septiembre y no se encontró nada; se revisó en la calle corregidora #163; pero no se encontraban en el domicilio. **18 de diciembre del 2018** se llevó al paisa para las limas en la mañana, y se conectó la toma de Manuel Arellano; se reparó una fuga en Allende #44. **19 de diciembre del 2018** se reparó el tubo de cloración en el pozo de tejería; se conectó la toma de agua en la colonia independencia se hizo una cotización en la calle Prol. Jesús Navarro S/N. **20 de diciembre del 2018** se continuó tapando la zanja en la colonia independencia se hizo una cotización en la colonia independencia en la calle Rosario castellanos #64 para drenaje, y se hizo otra de agua y drenaje en la colonia magisterial calle Manuel García Quirós #10. **21 de diciembre del 2018** se conectó la toma de la colonia magisterial; se reparó una fuga de agua en calle Obregón #224; se sopleteó una toma en colonia Juan Gil Preciado "la laguna" y se sopleteó otra toma en la rinconada colonial #30.

**Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:**

**Fugas de agua**

**Calle Prol. Jesús Navarro**

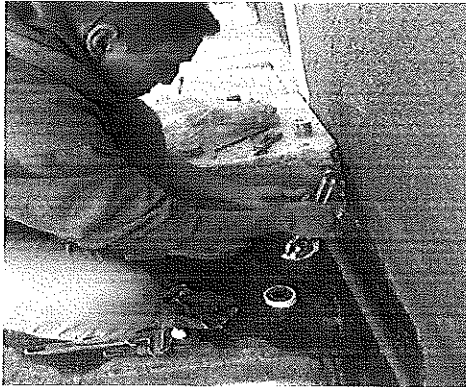

**Calle A.S. Bravo**




**Calle Jesús Narro**




**Calle Obregón**



**Calle Guerrero (tubo de 3")**

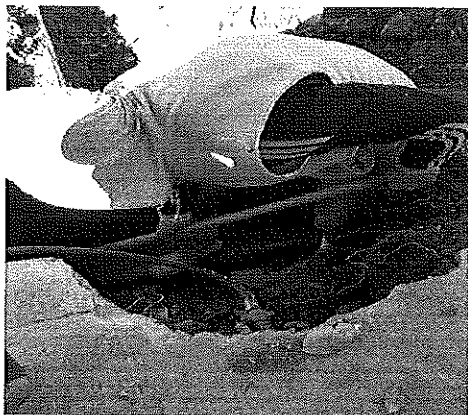



**Calle Guerrero**

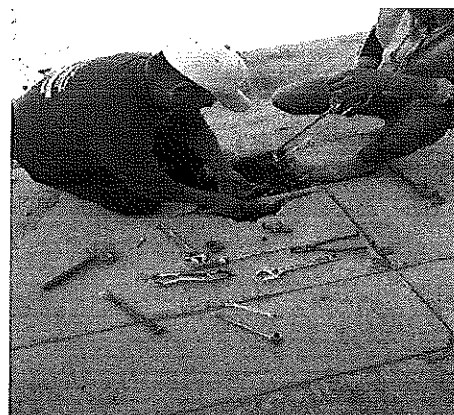

**-Reparación fuga de agua en Calle Prol. Jesús Navarro**




**-Reparación de fuga de agua en Calle Vallarta (Tubo de 8")**

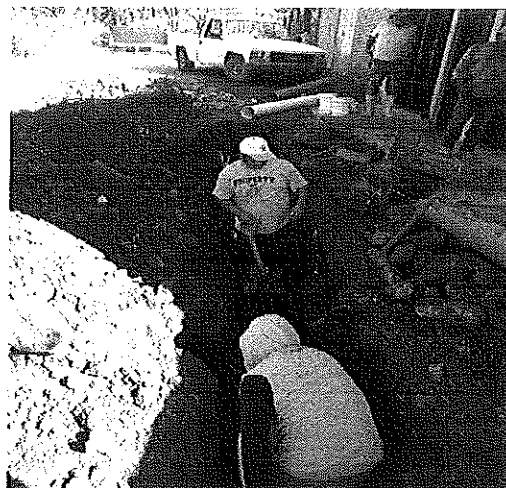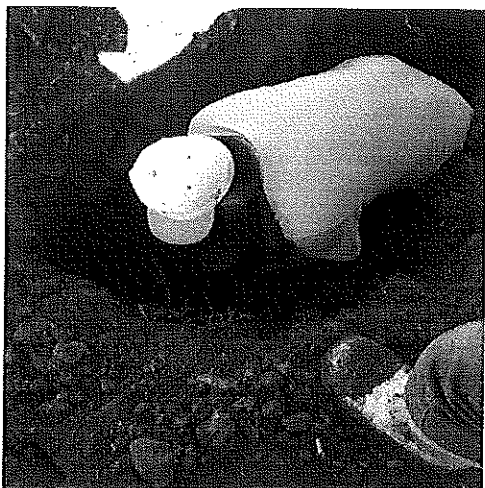

**-Reparación de línea de agua en calle Guerrero**



**-Reparación línea de agua en calle Guerrero, tubo "3"**

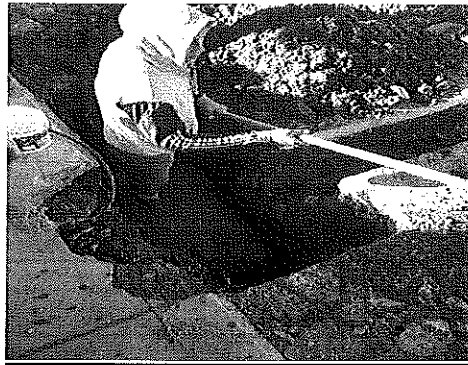

### **Instalación de tomas de Agua y Drenaje**

**-Tomas de agua**



**Calle: Prof. Manuel García Quiroz #10  
Col. Magisterial**

**-Tomas de agua**



**Calle Beatriz Hernández #22,  
Col. Independencia**



**Calle Morelos #447, Col. Centro**



**Calle Manuel Arellano #236, Col. San Gabriel**



**Parches por reparación de Fugas de agua**



**Calle Zapata Esq. Ramón López**

**La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de Diciembre de 2019**

Período: 01/12/2018 al 31/12/2018																	
Cuota Fija:	\$6,780.12	Bonificación:	\$20,899.56	Reconexión:	\$0.00	<b>Total</b> <b>\$209,422.39</b>											
Saneamiento:	\$26,126.11	Sanción:	\$0.00	Otros:	\$6,347.30												
Infraestructura:	\$4,810.69	Certificados:	\$106.44	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Bonificaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tercera Edad:</td> <td>\$397.24</td> </tr> <tr> <td>Viudo:</td> <td>\$161.10</td> </tr> <tr> <td>Discapacidad:</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td>Pensionado:</td> <td>\$0.00</td> </tr> </tbody> </table>		Bonificaciones		Tercera Edad:	\$397.24	Viudo:	\$161.10	Discapacidad:	\$0.00	Pensionado:	\$0.00	No. de Recibos:	<b>93</b>
Bonificaciones																	
Tercera Edad:	\$397.24																
Viudo:	\$161.10																
Discapacidad:	\$0.00																
Pensionado:	\$0.00																
Permiso de Instalación:	\$0.00	Reposición:	\$0.00			No. de Contratos:	<b>87</b>										
Conexión de Agua:	\$7,674.70	Materiales:	\$7,835.67														
Conexión Alcantarillado:	\$10,338.79	Permiso para Romper:	\$4,644.59														
Rezagos:	\$132,044.49	Gastos de Ejecución:	\$2,125.12														
Recargos:	\$7,827.10	Mano de Obra:	\$13,060.83														

**Los EGRESOS correspondientes a Diciembre (01 al 21 de Diciembre de 2019) son los siguientes:**

*Luz pozos :	436,032
*Nómina:	97,554.80
*Complemento Aguinaldo (Octubre –Diciembre)	39,433.10
*Comisiones bancarias:	313.20
*Material de fontanería	10,762.60
*Renta de transformador	5,220
*Cartucho samsung (toner negro)	420
*Mantenimiento de pozos	6,528.36
*Mantenimiento de vehículos	13,920.80

**TOTAL = \$610,184.86**



ATENTAMENTE

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del  
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"  
"Sufragio efectivo, no reelección"**

  
  
*Juan Mauricio Campos*  
**G. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA**

**DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO**



**2018 - 2021  
AGUA  
POTABLE**
