


## A QUIEN CORRESPONDA:

*Degollado Jalisco, a 08 de Febrero del 2019*

Por medio de la presente y de la manera más atenta. Me dirijo a usted brindándole un cordial saludo y a la vez hacer de su conocimiento que el Sistema de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento del Municipio de Degollado Jalisco, presenta el siguiente **Reporte de Actividades**, del 01 de Enero al 31 de Enero de 2019, realizado por nuestro personal operativo, procurándose atender los reportes de manera rápida y eficiente en la medida de lo posible a nuestra población.

A continuación se visualiza el trabajo operativo realizado de una manera gráfica:

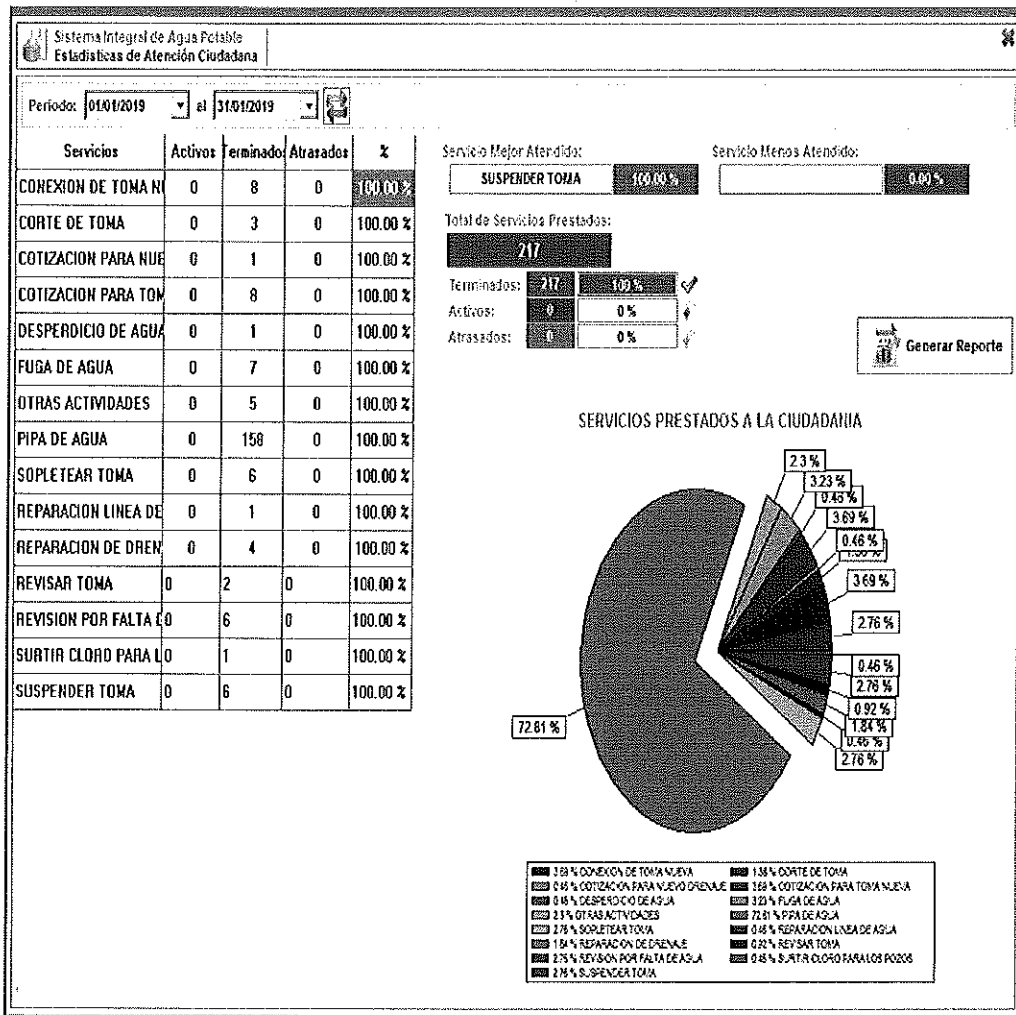

### **Bitácora de reportes realizados por personal operativo:**


**Miércoles 2 de enero de 2019** se inició con la conexión de drenaje en la Col. Independencia. **Jueves 3 de enero del 2019** se terminó de conectar la línea de drenaje en la Col. Independencia. **4 de enero del 2019** se tapó la zanja de drenaje en la Col. Independencia se hizo una cotización para Gerardo Bravo Col. Moisés Quezada, de agua y otra para Ana Berta Ramírez Colonia García Paniagua, Calle Roberto Quezada. **7 de enero del 2019** Se arregló la fuga de agua en calle 16 de septiembre en el súper. Se revisó la línea de Mercado 85; se hizo una cotización en Margarito Ramírez 96 A y otra para la calle Negrete Colonia centro, se instaló una toma en la en los departamentos verdes; Se revisó la toma en Ávila Camacho y está bien. **8 de enero del 2019** se conectó el drenaje en la Colonia Independencia pero faltó un tramo porque se ocupaba la retro con el rotomartillo. **Miércoles 9 de enero del 2019** Se revisó el drenaje de San Ignacio del roble pero hay que hacer un hoyo para revisar mejor a ver si tiene corriente; Se revisó la toma de 5 de mayo 330, se sopleteó la toma de Obregón 254 A; se fue a checar el domicilio de David Alfaro Siqueiros pero no tenía toma; Se revisó el domicilio en Francisco Sarabia# 79 y se canceló porque está dañada su línea; se hizo una cotización en Zaragoza # 66 centro; se reparó la fuga de Defensores cerca de la casa pastoral; Se revisó la toma en la calle azucena #150 y no se encontró nadie; Se revisó la toma en la calle Dalias # 96 y es falta de presión; se hizo una cotización en San Ignacio del roble pero qué dijo que no cumplan con los requisitos; se conectó la toma en la calle Jesús Navarro # 268; se puso un pedazo de manguera en el pozo 3 a 2 en la del llenado y se llevó cloro al pozo de tejería. **10 de enero del 2019** se reparó una fuga en la calle mercado 127; se instaló una toma en la Colonia Independencia; se rayó en la calle Juárez para una toma. **11 de enero del 2019** se instaló una toma en la calle Juárez # 230 A y se terminó de conectar el drenaje de la Colonia Independencia; se conectó una toma en Negrete # 28; se hizo una cotización en Vallarta # 38; se canceló una toma en Ramón López #18 colonia San Gabriel; se canceló una toma en la calle tulipanes corral de ganado se sopleteo la pizzería magos en calle Hidalgo. **14 de enero del 2019** se hizo una cotización en Vallarta 28 se hizo otra cotización en 5 de mayo 227 a Tomás de agua se puso la toma de Gómez Farías 19 pero faltó una abrazadera de fierro y llega hasta el jueves se inició con la desasoladora para el drenaje de Matamoros pero no se pudo salieron piedras. **15 de enero del 2019** se fue al drenaje que se estaba destapando en San Ignacio del roble y está limpio no tiene nada y no tiene corriente; se hizo una cotización en prolongación Gómez Farías #210 y otra cotización en Pascual Ortiz rubio #36 se reparó una fuga en San Jose buen agua en calle Degollado #56. **16 de enero del 2019** se conectó un drenaje en Calle madero #100 uno se comenzó con la búsqueda de la fuga en república. **17 de enero del 2019** se llevó cloro al pozo de rollo de los novios y también se llevó cloro al pozo de San José Buen agua y se reparó el tubo de cloración se canceló una toma en San José buen agua. **18 de enero del 2019** se conectó la línea de agua en la Colonia García Paniagua se echó un parche en Juárez y otro en mercado. **21 de enero del 2019** se reparó una fuga en frente del DIF Se tiró el escombros y se le echó tepetate, se conectó el drenaje de Vallarta #38 Colonia Moisés Quezada; se le puso un cople de cobre en una fuga la comandancia se fue a checar el drenaje Aldama con Yépez y se fue a

chechar en Juárez una fuga nada más se fue para ubicar; se canceló una toma en Allende #216. **22 de enero del 2019** reparación de la línea nueva en Juárez casa de Juanita; se sopeteó una toma en calle Ávila Camacho #6; se revisó en 20 de noviembre y se hizo una cotización para Calle Mariano Azuela Colonia Juan Gil preciado. **23 de enero del 2019** se pusieron dos llaves en el pozo presa dos fueron una compuerta y otra de paso; Se recogió el escombro de Mercado #128 se instaló una toma de agua en Pascual Ortiz Rubio #36 Colonia Colosio; se sopeteo la línea de López cotilla #162; se echó un parche en mercado y se echó otro parche en Ángeles se Bravo. **24 de enero del 2019** se conectó una toma en la Colonia Juan Gil preciado; se reparó una fuga en la calle Ocampo #254 a se instaló una toma en Vallarta sino se fue a Juárez 76 pero no salieron era para sopletear. 25 de enero del 2019 se fue ala víbora a poner una llave de paso en el depósito Se arregló la válvula de prolongación Ángel s Bravo se terminó de conectar la toma de Vallarta si número se canceló una toma Ramón López Velarde 180 se reparó una fuga en Francisco gallardo sin número. 28 de enero del 2019 se conectó una toma de agua en Zaragoza se rayó en la calle rayón en una válvula por una fuga se hizo una cotización en el taller de Aristeo con Lupita fuentes Se arregló la válvula en 5 de mayo con Moisés quesada. **29 de enero del 2019** se reparó una fuga en San José buen agua se hizo una cotización en Nicolás Bravo y rayón Se recogió el escombro en mercado y Gómez Farías número 19 y Ángel s Bravo se hizo una cancelación en la calle 1 de mayo # 275 se reparó una fuga en 1 de mayo #11 se reparó una fuga en Allende. **30 de enero del 2019** se reparó una fuga en Guerrero #130 a se conectó una toma de agua en Zaragoza #78; se instala una llave de paso PVC en la línea de cloración en el pozo de San José o en agua y se puso otra llave de paso de PVC en el pozo presa dos; se instaló una toma en 5 de mayo #219; se hizo una cotización en Zaragoza #75 A se canceló una toma en circunvalación # 54.

**Se presentan algunas fotografías de los reportes atendidos:**

**Fugas de agua**

**Calle Guerrero #30 A**

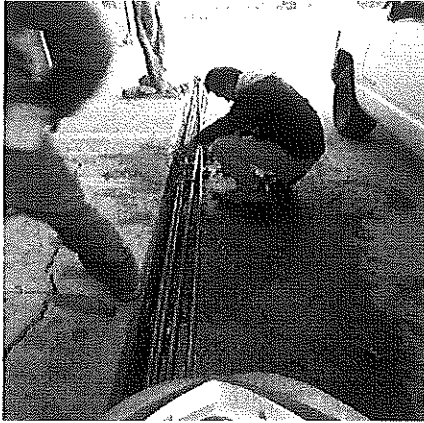

**1° de Mayo, frente al DIF**



**-Reparación fuga de agua en Calle Mercado #127**



**-Reparación fuga de agua en Calle Juárez**




**-Reparación de un cople en la línea de agua de la comandancia**



**Instalación de tomas de Agua y Drenaje**


**-Tomas de agua**

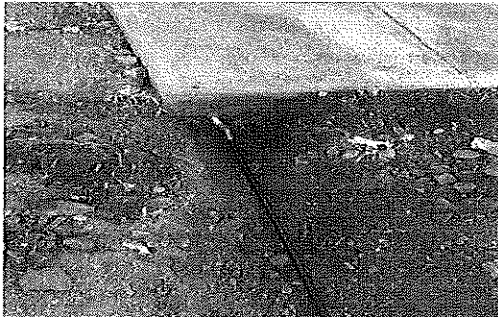

**Calle: Vallarta #38**



**Calle Roberto Quezada #2  
Col. Javier García Paniagua**

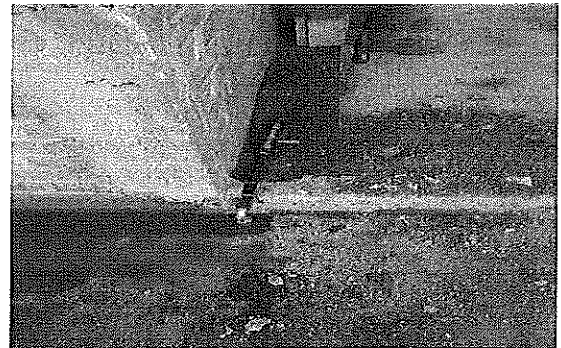


**Calle: Zaragoza #78-A**


**-Conexión de Drenajes**



**Calle: Beatríz Hernández,  
Col. Independencia**

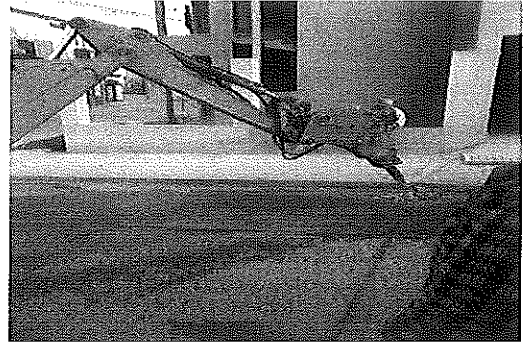

**Calle Madero #101**

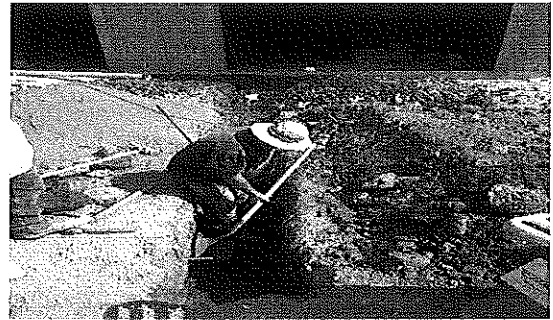

**Calle: Josefa Ortiz de Domínguez**



**Calle: Prol. Vallarta**

**Parche en Calle Mercado #128**



**La RECAUDACIÓN correspondiente a los mes de Enero de 2019**

Periodo: 01/01/2019 al 31/01/2019							
Cuota Fija:	\$3,902,637.00	Bonificación:	\$1,501,808.70	Reconexión:	\$0.00	<b>Total</b>	
Saneamiento:	\$877,918.37	Sanción:	\$0.00	Otros:	\$3,119.55		<b>\$4,009,349.10</b>
Infraestructura:	\$158,611.35	Certificados:	\$0.00	<b>Bonificaciones</b>		Ho. de Recibos:	<b>2750</b>
Permiso de Instalación:	\$957.98	Reposición:	\$0.00	Tercera Edad:	\$54,752.90	Ho. de Contratos:	<b>2607</b>
Conexión de Agua:	\$8,442.17	Materiales:	\$3,040.66	Viuda:	\$8,699.41		
Conexión Alcantarillado:	\$10,338.79	Permiso para Romper:	\$1,945.58	Discapacidad:	\$966.60		
Rezagos:	\$485,737.95	Gastos de Ejecución:	\$5,694.01	Pensionado:	\$1,933.20		
Recargos:	\$49,725.38	Mano de Obra:	\$11,988.96				

**Los EGRESOS correspondientes a Diciembre (01 al 31 de Enero de 2019) son los siguientes:**

*Luz pozos :	385,764
*Pago de préstamo a particular	507,500
*Nómina:	85,253.80
*Personal eventual	7,018
*Tiempo extra (pipero)	250
*Gastos médicos	3,000
*Comisiones bancarias:	290
*Gasolina	52,866.2
*Material de fontanería	2,616.98
*Caja	5,000
*Material eléctrico para pozos (sonda)	7,139.80
*Mantenimiento de vehiculos	17,610

TOTAL = **\$1,074,308.70**

**ATENTAMENTE**

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del  
XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"  
"Sufragio efectivo, no reelección"**

---

**C. JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA**

*DIRECTOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y  
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE DEGOLLADO, JALISCO*

c.c.p. Archivo

Anexo. Reporte de Sondeo de pozos del Sistema de Agua Potable realizado por el  
Director Operativo



Fecha: 08-02-19

Asunto: el que se indica

**JUAN MAURICIO CAMPOS ABARCA**  
**DIR. DE SIAPADEG**

**Presente:**

El que suscribe C. Dionisio Ornelas Hernández supervisor operativo de Agua Potable de Degollado Jalisco 2018-2021 por medio del presente curso le envió un cordial saludo y al mismo tiempo aprovecho para notificarle lo siguiente respecto a la visita y revisión de los pozos:

Pozo	Fecha
San José Buen Agua	30/01/2019
Voltaje	418/423/420
Amperaje	58/70/71
Nivel Estático	142 Mtro.
Nivel Dinámico	175 Mtro.
Precisión	9 Litro X segundo
Presión	12 kg. cm <sup>2</sup>
Cloro	Ideal 1.5
Novios	29/02/2019
Voltaje	432/432/435
Amperaje	42/44/45
Nivel Estático	111 Mtro.
Nivel Dinámico	141.5 Mtro.
Flujo del Agua	4.5 Litro x segundo
Presión	10 kg cm <sup>2</sup>
Cloro	Ideal 1.5

Tejeria	30/01/2019
Voltaje	468/469/470
Amperaje	166/170/173
Nivel Dinámico	109 Mtro.
Presión	10.5 kg cm <sup>2</sup>
Cloro	Ideal 1.5
Presa #1	05/02/2019
Voltaje	442/421/426
Amperaje	63/67/61
Presión	6.7 kg cm <sup>2</sup>
Cloro	Ideal 1.5
*No tiene manguera para sondearlo	
Presa #2	05/02/2019
Voltaje	437/443/439
Amperaje	129/137/139
Presión	6.7 kg cm <sup>2</sup>
Cloro	Ideal 1.5
Flujo del Agua	22 litros x segundo
*la manguera esta floja y marca muy arriba	

Se repararon 2 dosificadores el 07/02/2019 para pozo #1 y #2

**ATENTAMENTE**

**DEGOLLADO JALISCO 08 DE FEBRERO 2019**




---

**DIONISIO ORNELAS HERNANDEZ  
SUPERVISOR OPERATIVO**
